



## MONTAGE DER EINZELTEILE

Arb. folge	Stückzahl	Arbeitsgangbeschreibung	Arb.-zeit	Ges. (min)
01	1	vorbereitende technische Aufbereitung der Zeichnungsunterlagen <b>Baugruppe Sockel</b> (Teile 01 bis 09)	60	60
02	2	auf Sockelseitenwand Teil 2 und Sockelfrontwand Teil 3 Linien für die Aufleimungen der Sandsteine aufzeichnen Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben,	25	50
03	2	Längen der Aufleimungen für Sandsteine nachzeichnen, 12 Stück Aufleimungen für Teil 2 aus Streifen 2x21x238 und je 2x31x238 schneiden, beschleifen und aufleimen, 9 Stück Aufleimungen für Teil 3 aus Streifen 2x21x143 und je 2x31x138 schneiden, beschleifen und aufleimen	210	420
04	2	Teile 2 und 3 Aufleimungen für Sandstein an Außenkanten beschleifen	8	16
05	2	Mauervorsatz Teil 9 in Aussparung (Aufleimungen) von Sockelfrontwand Teil 3 einpassen, winklig ausrichten und einleimen	7	14
06	2	Sockelseitenwand Teil 4 stumpf an Sockelfrontwand Teil 3 anpassen, winklig ausrichten und anleimen	6	12
07	1	Lage der 3 Stufen Teil 8 zueinander anzeichnen, Stufen nacheinander zusammenpassen, ausrichten und verleimen	16	16
	1	3 Stück zusammengeleimte Stufen Teile 8 aufspannen, kompl. Sockelwandteile 3 beidseitig an Stufen Teile 8 einpassen, beidseitig Aussparungen an letzte Stufe anzeichnen und aussägen und beschleifen, danach erst die Stufen mit den Sockelwandteile verleimen	35	35
08	1	Sockelfrontwand Teil 5 an Sockelseitenwände Teil 4 anpassen, winklig ausrichten und anleimen		
09	1	Stufen Teile 6 und 7 zusammenpassen, ausrichten und verleimen, zusammengeleimte Stufen zwischen Teile 4, auf letzte Stufe Teil 8 sowie gegen Teil 5 einpassen, ausrichten und einleimen	18	18
10	2	Sockelseitenwände Teil 2 beidseitig stumpf an Frontwände Teil 3 ansetzen, winklig ausrichten und anleimen	8	16
11	1	2 Leisten Teil 1.1 zur Verstärkung der Auflage Bodenbrett Teil 1 zwischen Seitenteile 2 einsetzen, ausrichten und einleimen, Bodenbrett Teil 1 auf gesamten Sockel auflegen, ausrichten und aufleimen	25	25
12	1	vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (außer Oberflächen Teil 1), nachschleifen und endbehandeln <b>Baugruppe Tempelaufbau</b> (Teile 10 bis 43)	72	72
13	1	Sitz folgender Einzelteile auf Rückwand Teil 10 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: 1 Stück Fenstereinsatz Teil 35 und Fenster Teil 36 auf Fenstereinsatz	10	10
14	1	Komplette Rückwand Teil 10 mit Anbauteile mit 2 Stück Seitenwände Teile 11 zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen, Podest Teil 24 einpassen, ausrichten und einleimen	18	18
15	1	Tempelwandteile 12 stumpf zusammenpassen, ausrichten und verleimen, Mauerverbinder Teil 16 auf Stoßstelle aufpassen, ausrichten und aufleimen, nach Aushärtung Kontur nachschleifen	14	14
16	1	Tempelwandteil 12 auf Seitenteile 11 auflegen, ausrichten, nicht verleimen, Lage auf Rückseite anzeichnen, abnehmen, bereitstellen zum lasieren	8	8



17	1	Tempelwandteil 12 auf Rückseite lasieren (außer Klebeflächen zu Teile 11), nachschleifen und endbehandeln	14	14
18	1	Tempelwandteil 12 nach dem Lasieren auf Seitenteile 11 auflegen, ausrichten, verleimen	8	8
19	1	Lage der Tempelwandteil 15 zu Teil 12 anzeichnen, 4 Stück Teile der Formleiste Nr. 5 ausmessen ablängen	60	60
18	1	und entsprechende Gehrungen 45 Grad schneiden, Lage aufzeichnen und auf Teile 11 und 12 aufpassen, ausrichten und aufleimen		
19	1	Mauersimse Teile 33 und 34 auf Teile 11 bzw. 12 aufpassen, winklig ausrichten und aufleimen	16	16
20	1	Lage der Bundeslade auf Teil 10 und 24 aufzeichnen und kompl. Baugruppe bereitstellen zum Lasieren	5	5
21	1	kompl. Baugruppe lasieren (außer angezeichnete Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln	62	62
22	4	Tempelwandteil 13 Längen der Aufleimungen für Sandsteine nachzeichnen, 1 Stück Aufleimung aus Streifen 3x30x145, 6 Stück aus Streifen 3x24x145 und 8 Stück aus Streifen 3x24x35 schneiden, beschleifen und aufleimen, Loch nach Aushärtung aus- und nachschneiden	160	640
23	4	alle Außenflächen und Deckfläche mit Aufleimungen beschleifen	12	48
24	4	Sitz folgender Einzelteile auf Tempelwandteil 13 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: je 1 Stück Mauersimse Teile 40, 41 und 42 sowie 1 Stück Fenstersteg Teil 13.1, auf Rückseite Fenster Teil 43	20	80
25	4	Tempelwandteil 13 mit allen Anbauteilen lasieren (außer Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln	23	92
26	2	Tempelseitenteil 14 Längen der Aufleimungen für Sandsteine nachzeichnen, 1 Stück Aufleimung aus Streifen 3x30x34 und 10 Stück aus Streifen 3x24x34 schneiden, beschleifen und aufleimen,	110	220
27	2	alle Außenflächen und Deckfläche mit Aufleimungen beschleifen	10	20
28	2	Tempelseitenteil 14 mit allen Anbauteilen lasieren (außer Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln	6	12
29	2	Tempelfrontteil 15 Längen der Aufleimungen für Sandsteine nachzeichnen, 1 Stück Aufleimung aus Streifen 3x30x61, 4 Stück aus Streifen 3x24x61, 6 Stück aus Streifen 3x24x20 und 6 Stück aus Streifen 3x24x30 schneiden, beschleifen und aufleimen, Loch nach Aushärtung aus- und nachschneiden	190	380
30	2	alle Außenflächen und Deckfläche mit Aufleimungen beschleifen	14	28
31	2	Sitz folgender Einzelteile auf Tempelfrontteil 15 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: je 1 Stück Fenstersimse Teile 38 und 39 sowie auf Rückseite Fenster Teil 37	14	28
32	2	Tempelfrontteil 15 mit allen Anbauteilen lasieren (außer Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln	15	30
33	2	je 2 Stück Tempelwandteile 13 mit je 1 Stück Tempelfrontteil 15 und Tempelseitenteil 14 zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen	18	36
34	1	kompl. Baugruppen 10 bis 12 an gekennzeichnete Flächen von Teile 12 beidseitig ansetzen, winklig ausrichten und nacheinander anleimen und verspannen	20	20
35	1	Lage der kompl. montierten Tempelteile auf Bodenbrett 1 aufzeichnen, Tempelteilbaugruppe aufsetzen, ausrichten und aufleimen	12	12
36	1	Geländerteile 18 bis 20 nach dem Lasieren zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen	10	10
37	1	2 Stück kompl. montierte Geländerbaugruppen beidseitig auf Bodenbrett und gegen Tempelfrontteil 15 aufsetzen winklig ausrichten und aufleimen	16	16
38	2	genaue Länge der kompl. Säulenteile bestimmen und danach Säulensockel Teil 17 genau ablängen	5	10
39	2	Säule aus Teile 17 und 21 bis 23 nacheinander zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen, nach Aushärtung kompl. Säule lasieren (außer Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln	35	70
40	1	Lage der komplette Säulen auf Bodenbrett Teil 1 anzeichnen, kompl. Säulen aufpassen, ausrichten und aufleimen	12	12
41	1	Traufsims Teil 28 auf Traufe Teil 30 auflegen, ausrichten und aufleimen, 2 Stück Verzierungen Teile 32 beidseitig auf Sims auflegen, ausrichten und aufleimen, 2 Stück Wandteile 27 beidseitig an den Enden an Teil 30 ansetzen, winklig ausrichten und anleimen, 2 Stück Frontteile 26 beidseitig an Teil 27 ansetzen, ausrichten und anleimen, je 2 Stück Mauersimse Teil 29 und Verzierungen Teile 31 aufsetzen, ausrichten und anleimen,	62	62




		<b>ACHTUNG;</b> Formleiste Nr. 8 noch nicht einleimen		
42	1	kompl. Baugruppe nur Rückseite lasieren (außer angezeichnete Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln	16	16
43	1	vor dem Einbau der Baugruppe Bodenbrett Teil 1 lasieren, nachschleifen und endbehandeln	47	47
44	1	kompl. Baugruppe Traufe zwischen Tempelseitenteile 14 einpassen, ausrichten und einleimen,	9	9
45	1	Dachbrett Teil 26 auf Tempelteile aufsetzen, Unebenheiten prüfen (gegebenenfalls Unebenheiten beschleifen) Formleiste Nr. 8 erst jetzt Längen ausmessen, ablängen, Gehrungen 45 Grad schleifen, auf Teile 26, 28 und 29 aufsetzen, ausrichten und einleimen	67	67
46	1	Unterseite Dach sowie komplette Vorderseite der Baugruppe Traufe mit Formleiste lasieren, nachschleifen und endbehandeln	53	53
		<b>Baugruppe Dachaufsätze</b> (Teile 44 bis 55)		
47	1	Dachfrontteile 46 bis 48 zusammenpassen, ausrichten und verleimen, kompl. Baugruppe vor dem Aufbau lasieren, nachschleifen und endbehandeln, Lage auf Dach anzeichnen und kompl. Baugruppe aufsetzen, ausrichten und aufleimen	51	51
48	8	Sitz folgender Einzelteile auf Turmteil 44 und 45 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: je 1 Stück Fenstersims Teile 54 und 55	8	64
49	2	Turmteile 44 und 45 mit allen Anbauteilen zu Kasten zusammensetzen, ausrichten und verleimen	17	34
50	2	Dachbodenaufsätze Teile 52 und 53 zusammenpassen, mittig ausrichten und verleimen, auf Dachboden Teil 51 aufpassen, mittig ausrichten und aufleimen, kompl. Dachboden in Turm einsetzen, ausrichten und einleimen	15	30
51	2	kompl. Dachtürme mit allen Anbauteilen lasieren (außer Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln	20	40
52	2	kompl. Dachtürme auf Dachbrett Teil 25 und gegen Dachaufsatzteile 46 ansetzen, ausrichten und aufleimen	5	10
53	2	Dachaufsatzteile 46 und 49 zusammenpassen, ausrichten und verleimen, Baugruppe vor dem Aufbau lasieren, nachschleifen und endbehandeln, Lage auf Dachbrett anzeichnen und Baugruppe aufsetzen, ausrichten, aufleimen	11	22
		<b>ACHTUNG:</b> Dachaufsatzhinterteil 50 noch nicht aufleimen		
		<b>Baugruppe Kuppel</b> (Teile 56 bis 61)		
54	8	Kuppelwandteil 56 beidseitig Gehrung 22,5 Grad anbringen und beschleifen	4	32
55	8	Verzierung Teil 58 genaue Länge bestimmen und beidseitig Gehrung 22,5 Grad anbringen und beschleifen	5	40
56	8	Formleiste Nr. 1 genaue Länge bestimmen und beidseitig Gehrung 22,5 Grad anbringen und beschleifen	8	64
57	8	Sitz folgender Einzelteile auf Kuppelwandteil 56 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: 1 Stück Fenster Teil 60 auf Rückseite, Verzierung Teil 58 und Formleiste Nr. 1 auf Vorderseite	12	96
58	8	kompl. Kuppelwand vor der weiteren Montage einmal lasieren (außer Klebeflächen)	8	64
59	1	kompl. Kuppelwandteile nach Aufriß zu Achteck zusammensetzen, ausrichten und verleimen	48	48
60	1	Nahtstellen der komplette Kuppel bei Bedarf mit Holzkitt verfüllen, nach dem Aushärten beschleifen	20	20
61	1	kompl. Kuppel vor dem Endlasieren nachschleifen, endbehandeln	23	23
62	1	Kuppeldach Teil 57 auf Kuppelwände aufsetzen, ausrichten und aufleimen	6	6
53	1	Kuppeldachseitenwände Teile 59 nach Aufriß zu Achteck zusammensetzen, ausrichten und verleimen	40	40
54	1	kompl. zusammengeleimte Seitenwände auf Kuppeldach aufsetzen, ausrichten und aufleimen, Kuppel Teil 61 auf Kuppeldach aufsetzen, ausrichten und aufleimen	18	18
55	1	Kuppeldach mit Seitenwände und Kuppel lasieren, nachschleifen und endbehandeln	46	46
56	1	Lage der komplette Baugruppe Kuppel mit allen Anbauteilen auf Dachbrett Teil 25 anzeichnen, Kuppel aufsetzen, ausrichten und aufleimen	8	8
57	2	Dachaufsatzhinterteil 50 an Formleiste Nr. 8 und Dachaufsatzteil 49 anpassen, vor dem Anbauen lasieren, nachschleifen und endbehandeln, auf Dachbrett aufsetzen, ausrichten und anleimen	18	36
58	1	Dachbrett lasieren, nachschleifen und endbehandeln	5	5
		<b>Baugruppe Bundeslade</b> (Teile 64 bis 72)		



59	1	Lage der Teile 65 bis 68 auf Rückwand Teil 64 anzeichnen, nacheinander 2 Stück Füße Teil 65, je 1 Stück Bankauflage Teile 66 und 67 und 4 Stück Abstandshalter Teile 68 auf gekennzeichnete Flächen aufsetzen, ausrichten und aufleimen. Trennwand Teil 69 einpassen und einleimen, Fußleiste Teil 70 und Formleiste Nr. 6 einpassen, ausrichten und aufleimen	28	28
60	1	römische Zahlen auf Banklehnen Teile 71 und 72 aufzeichnen, einbrennen, beschleifen, auf entsprechende Abstandshalter aufsetzen, ausrichten und aufleimen	22	22
61	1	Komplette Bundeslade lasieren (außer Klebeflächen und Rückseite), nachschleifen und endbehandeln	15	15
62	1	Komplette Bundeslade auf Podest Teil 24 und gegen Rückwand Teil 10 aufsetzen, ausrichten und einleimen	5	5
<b>Baugruppe Opfertisch (Teile 73 bis 77)</b>				
63	4	Sitz folgender Einzelteile auf Seitenwand Teil 74 und Frontteil 75 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: je 1 Stück Verzierung Teil 77 auf Rückseite	3	12
64	1	Seitenwand Teil 74 mit Frontteil 75 zusammenpassen, genau winklig ausrichten und verleimen, Tischplatte Teil 73 probeweise einsetzen, genaue Länge markieren und zusägen, Tischplatte gegen Teile 74 und 75 ansetzen, ausrichten und anleimen, zweites Teil 74 auf Frontteil 75 aufsetzen, ausrichten und anleimen, mit Frontteil 75 verschließen und verleimen. Längen der Fußleisten Teile 76 markieren, ablängen und aufleimen, kompl. Opfertisch lasieren, nachschleifen und endbehandeln, in linke Nische auf Bodenbrett aufsetzen, ausrichten, aufleimen	47	47
<b>GESAMT (min)</b>				<b>3913</b>

<b>Baugruppe Hocker (Teile 89 bis 91)</b>				
12		Mittelsteg Teil 91 mittig auf Hockerauflage aufsetzen, ausrichten und verleimen, beidseitig Hockerfüße Teile 89 gegen Mittelsteg und auf Hockerauflage aufsetzen, ausrichten und aufleimen, kompl. Hocker lasieren, nachschleifen und endbehandeln	9	108

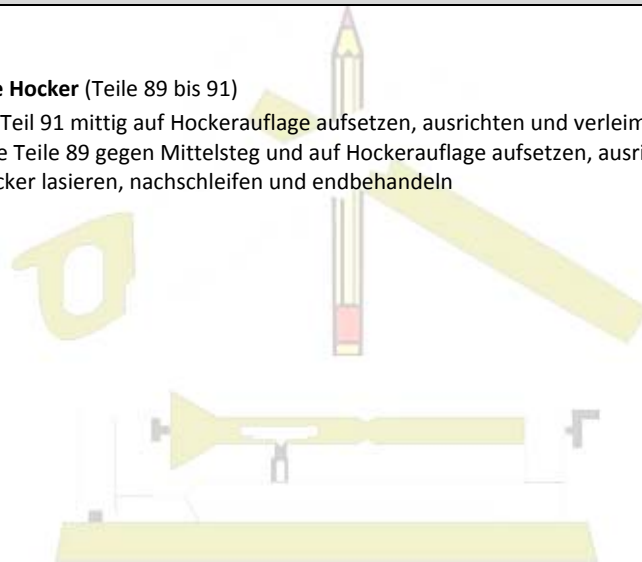



## STÜCKLISTE

Pos.	Bauteil	Stkzahl	Abwicklung	Dicke	Abmessung
1	Bodenbrett	1	Rechteck mit Aussparungen	6	234x534
1.1	Vestärkungsleiste	2	Rechteck	10	25x500
2	Sockelseitenwand	2	Rechteck	8	83x238
2.1	Aufleimung Sandsteinimitat	2	Rechteck	3	83x238
3	Sockelfrontwand	2	Rechteck	8	83x148
3.1	Aufleimung Sandsteinimitat	2	Rechteck	3	83x148
4	Sockelseitenwand	2	Rechteck	8	32x83
5	Sockelfrontwand	1	Rechteck	8	17x246
6	Stufe	1	Rechteck	15	21x229
7	Stufe	1	Rechteck	15	30x229
8	Stufe	3	Rechteck	15	30x262
9	Mauervorsatz	2	Rechteck mit Aussparung	15	68x83
10	Rückwand	1	Rechteck mit Innenkontur	8	200x285
11	Seitenwand	2	Rechteck	8	44x286
12	Tempelwandteil	2	Kontur	4	125x287
13	Tempelwandteil	4	Rechteck mit Innenkontur	8	145x287
13.1	Aufleimung Sandstein	4	Rechteck	3	145x287
13.2	Fenstersteg (Formleiste)	4	Formleiste	8	14x102
14	Tempelseitenteil	2	Rechteck	8	34x287
14.1	Aufleimung Sandstein	2	Rechteck	3	34x287
15	Tempelfrontteil	2	Rechteck mit Innenkontur	8	61x287
15.1	Aufleimung Sandstein	2	Rechteck	3	61x287
16	Mauerverbinder	1	Rechteck	4	25x60
17	Säulensockel	2	Rechteck	4kt 36	x54
18	Geländerteil	2	Rechteck mit Innenkontur	4	51x59
19	Geländerteil	2	Rechteck mit Innenkontur	4	26x50
20	Geländerteil	2	Rechteck mit Innenkontur	4	50x132
21	Säulenfußplatte	2	Quadrat	8	44x44
22	Säule	2	Drechselteil		
23	Säulenkopfplatte	2	Quadrat	8	38x38
24	Podest	1	Rechteck mit Aussparungen	18	61x184
25	Dachbrett	1	Rechteck mit Aussparungen	6	283x534
26	Tempelfrontteil	2	Rechteck	4	45x62
27	Tempelwandteil	2	Rechteck	18	30x45
28	Traufsims	1	Rechteck mit Aussparungen	4	16x312
29	Mauersims	2	Rechteck mit Aussparung	4	16x38
30	Traufe	1	Rechteck mit Innenkontur	6	45x310
31	Verzierung	2	Quadrat	4	22x22
32	Verzierung	2	Rechteck	4	10x13
33	Mauersims	2	Rechteck	4	18x53
34	Mauersims	2	Rechteck	4	25x34
35	Fenstereinsatz	1	Kontur	4	72x135
36	Fenster	1	Kontur	4	61x121
37	Fenster	2	Kontur	4	43x103
38	Fenstersims	2	Kontur	4	d=30/d=48
39	Fenstersims	2	Kontur	4	19x32
40	Fenstersims	4	Rechteck mit Abschrägungen	4	20x85
41	Fenstersims	4	Rechteck mit Aussparungen	4	14x85
42	Fenstersims	4	Kontur	4	d=58/d=40
43	Fenster	4	Kontur	4	44x44





44	Turmteil	4	Rechteck mit Innenkontur	8	50x62
45	Turmteil	4	Rechteck mit Innenkontur	8	45x50
46	Dachaufsatzfrontteil	4	Rechteck mit Innenkontur	4	34x54
47	Dachaufsatzseitenteil	2	Rechteck	4	30x34
48	Dachaufsatzfrontteil	1	Kontur	4	43x304
49	Dachaufsatzseitenteil	2	Rechteck	8	25x50
50	Dachaufsatzhinterteil	2	Rechteck mit Aussparungen	8	50x155
51	Dachboden	2	Rechteck	15	45x47
52	Dachaufsatz	2	Quadrat	8	30x30
53	Dachaufsatz	2	Quadrat	8	13x13
54	Fenstersims	8	Rechteck mit Aussparung	4	11x33
55	Fenstersims	8	Rechteck mit Aussparung	4	9x19
56	Kuppelwandteil	8	Rechteck mit Innenkontur	8	84x114
57	Kuppeldach	1	Achteck	6	215x215
58	Verzierung	8	Rechteck mit Aussparungen	4	11x88
59	Kuppeldachseitenwand	8	Kontur	4	27x88
60	Fenster	6	Kreis	4	65x65
61	Kuppel	1	Drechselteil		
64	Rückwand	1	Kontur	4	113x120
65	Fuß	2	Rechteck mit Aussparung	8	33x38
66	Bankauflage	1	Rechteck	8	35x95
67	Bankauflage	1	Rechteck	10	14x80
68	Abstandshalter	4	Rechteck	4	8x19
69	Trennwand	1	Rechteck	4	38x70
70	Fußleiste	1	Rechteck	4	8x70
71	Banklehne 1	1	Kontur	4	31x47
72	Banklehne 2	1	Kontur	4	31x47
73	Tischplatte	1	Quadrat	4	40x40
74	Seitenwand	2	Rechteck mit Innenkontur	4	40x66
75	Frontteil	2	Kontur	4	58x75
76	Fußleiste	4	Rechteck	4	18x55
77	Verzierung	4	Quadrat	4	32x32
Nr. 1	Formleiste	1			L=800
Nr. 5	Formleiste	1			L=200
Nr. 6	Formleiste	1			L=70
Nr. 8	Formleiste	1			L=500

Und nun wünschen wir viel Spaß!  
Ihr www.laubsaege.de Team

Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der [www.laubsaege.de](http://www.laubsaege.de) und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.
